

Jokuset Kyläyhdistys ry/Kehittyvä Kuusaa -kehittämishanke

LOPPURAPORTTI

1.1.2017-31.12.2018



Teija Nurmenniemi

31.12.2018

Sisällysluettelo

1.	Toteuttajan nimi	2
2.	Hankkeen nimi ja hanketunnus	2
3.	Yhteenveto hankkeesta	2
4.	Raportti.....	3
4.1.	Hankeen tavoitteet.....	3
4.2.	Toteutus.....	3
4.3.	Tiedottaminen	8
4.4.	Resurssit.....	8
4.5.	Kustannusarvio ja rahoitus	8
4.6.	Raportointi ja seuranta.....	9
a)	budjetin seuranta	9
b)	raportointi ja seuranta.....	9
c)	toteutusoletukset ja riskit.....	9
4.7.	Yhteistyökumppanit	9
4.8.	Tulokset ja vaikutukset	9
5.	Jatkotoimenpiteet	10

1. Toteuttajan nimi

Jokuset Kyläyhdistys ry

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Kehittyvä Kuusaa -kehittämishanke, hankenumero 36237

3. Yhteenveto hankkeesta

Hankkeella pyrittiin kehittämään ja lisäämään Kuusaa-Jokelan kylien ja Kylätalo Eurolan kaikkien ikäryhmien harrastus- ja toiminta mahdollisuuksia sekä kylätalon vuokraus-, tapahtuma-, ja kylämatkailutoimintaa. Hankkeen aikana selvitetään ja suunnitellaan retkeily/hiihtoreitti, moottorikelkkareitin pistoreitti kylätalolle ja Hirsinevan natura-alueen ja Nuijunjärven kosteikkoalueen käyttömahdollisuuksia lintuharrastajien käyntikohteena.

Hankkeelle palkattiin osa-aikaisen projektipäällikkö Teija Nurmenniemi ja tuntityönä kirjanpitäjä Pertti Lampela ajalle 1.3.2017-31.10.2018, ja hankkeella oli ohjausryhmä, johon kuuluivat Maria Ruhala-Venetpalo, Taina Ruhala, Heikki Kumpula, Markku Piipponniemi, Pertti Lampela, Jarmo Koistila sekä Keskipisteen Leaderin edustajana Anni-Mari Isoherranen.

Hankkeella on saatu kehitettyä Kylätalo Eurolan toimintaa. Juhlalpalvelutoiminnassa on tehty menulistat eri juhlatilaisuuksia varten, jotka ovat hyvin toimineet asiakkaiden tilausten pohjana, on saatu määriteltyä Eurolan vuokrahinnat ja tehtyä vuokrausehdot. Kehittyvä Kuusaa -investointihankkeen Eurolan sisustusmuutokset ja astia hankinnat ovat edesauttaneet juhlapalvelutoiminnan kehittymistä. Eurolassa on lisääntynyt ulkopuolisten juhlatilaisuuksien järjestäminen ja tätä kautta on saatu työllistettyä ihmisiä ja tuloja kyläyhdistykselle toiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi. Eurolassa on järjestetty kaksi testitilaisuutta. Ensimmäinen testitilaisuus järjestettiin 10.6.2018 avoimet ovet tapahtumana, jossa esiteltiin leiritoimintaa ja juhlatoimintaa, mukana oli yhteistyökumppanina Maaselän Latu ry, osallistujia tapahtumassa oli 200 henkeä ja saatu palaute oli myönteistä. Toinen testitilaisuus järjestettiin 4.11.2018, jonka teemana oli juhlaruokien ja -tilojen testaus, tilaisuuteen osallistui n. 100 henkilöä, ja lisäksi tilaisuudessa oli 4 kutsuttua testaajaa. Testitilaisuuden palautteesta saatiin hyvin esille asioita, joilla saadaan luotua toimivampi juhlapalvelu kokonaisuus.

Kuusaa-Jokelan kylälle hankkeella suunniteltiin retkeily/hiihtoreitistö ja hankittiin maanomistaja luvat. Reitistön pituus on 4-7 km, ja reittivaihtoehtoja on useita. Lisäksi tehtiin reitti Kruununkivelle Karsikasmäelle. Hankkeella selvitettiin lintukohteita, vaihtoehtoina olivat Nuijunjärven kosteikko alue ja Hirsinevan natura-alue. Nuijunjärven kosteikkoalueelle ei voitu suunnitella lintutornia, koska siellä on kosteikkoalueen kunnostustyöt vielä kesken ja metsästysseurat ovat vuokranneet aluetta ympäröivät maa-alueet, eivätkä halunneet sinne lintutornia, jokainen halukas voi käydä alueeseen tutustumassa jokamiehen oikeudella. Hirsinevan alueella suunniteltiin lintutornin paikka Tervakankaan puolelle, mutta lintutornia ei voida rakentaa suunnitellulle paikalle eikä muutenkaan järkevään paikkaan Hirsinevalla. Metsähallitus ei anna maa-alueelle lupaa rakentaa lintutornia, koska se häiritsee tahattomasti/tahallisesti alueen herkkää linnustoa ja luontoa, alueella saa metsästää ja muutenkin liikkua jokamiehen oikeudella. Moottorikelkkareitin pistoreitin selvittämisestä luovuttiin, koska reitti siihen ei olisi saatu maanomistajalupia. Retkeily/hiihtoreittien investoinnit tehdään Retkeilevä Haapajarvi -hankkeella, mikäli hanke saa rahoituksen.

Hankkeella selvitettiin kyläläisten kiinnostusta Monipalvelukeskus toiminnasta, kiinnostus asiaa kohtaan oli vähäistä, asian jatko toimenpiteiden tekeminen jätettiin Jokuset Kyläyhdistykselle, Kyläyhdistys on mukana Rajaton Verkko hankkeessa, jolla tehdään myös kehittämistoimia Monipalvelukeskus toiminnasta.

Hankkeella tehtiin markkinointitoimenpiteitä. Jokuset Kyläyhdistys liittyi mukaan Kylään.fi -markkinointiporssiin, markkinointitoimintaa menttiin mukaan kylään.fi nettisivuille, ilmoituksilla valtakunnalliseen matkailukartastoon ja esitteeseen. Kuusaa-Jokelan kylästä tehtiin kyläesite ja päivitettiin uusi ilme kuusaa.com kotisivuille, hankittiin valokuvia ja tehtiin juhlapalveluista esite, sekä markkinointiin Eurolan palveluja ja tapahtumia facebook sivuilla sekä ollaan mukana visithaapajarvi.fi sivuilla.

Hankkeen alussa selvitettiin mahdollisuutta olla mukana kansainvälisessä airbnb.fi majoitustoiminnassa, mutta Kylätalo Eurolan toimintakriteerit eivät olleet riittävät toimintaan. Kesäkioski toiminnan aloittamisesta Jokuset kyläyhdistys ry ja hanke selvittivät tiedotteissaan kyläläisten halukkuutta olla mukana kesäkioskin ylläpidossa, mutta halukkuutta ei löytynyt, heinä-elokuussa 2018 kesäkioski toimi muutaman viikon. Hankesuunnitelmassa mainittiin harrastus- ja kurssitoiminnan kehittäminen, asiaa selvitettiin ja yritettiin saada kyläläisiä mukaan kehittämistyöhön, mutta halukkuutta ei löytynyt, joten voidaan todeta, että tässä vaiheessa kylällä ei ole tarvetta lisätä kurssi- ja harrastustoimintamahdollisuuksia. Tässä hetkellä Kylätalo Eurolassa toimii kansalaisopiston kurssitoimintaa ja lisäksi kyläyhdistys järjestää erilaista teema kurssitoimintaa

ympäri vuoden. Investointihankkeen toimien ja kalustohankintojen sekä ulkoilureittien kehittämisen myötävaikutuksella, kurssi- ja harrastustoiminta lisääntyy Eurolassa luontaisesti.

Hankkeen kustannusarvio oli 64 204,00 euroa, josta hanketuki 90 %:a, 57 783,60 euroa, ja omarahoitus 6420,40 euroa, josta suurin osa katettiin talkootyönä.

4. Raportti

Tässä raportissa kuvaillaan Kehittyvä Kuusaa -kehittämishankkeella tehtyjä toimenpiteitä 1.1.2017-31.12.2018. Raportti on loppuraportti hankkeen aikana tehdyistä toimista.

4.1. Hankeen tavoitteet

- ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on yhteys Manner-Suomen kehittämissuunnitelmaan: hankkeella lisätään maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua. Hankkeessa kyläyhteisö yhdessä kehittää Kylätalo Eurolaa ja sen ympäristöä, kehittämistoimilla lisätään harrastustoimintaa sekä mahdollisuutta työllistyä kylällä.
- yhteys Keskipisteen Leaderin strategiaan: 1. Yhteisöjen liiketoimintaan: Kannustetaan yhteisöjä liiketoimintaan kokeiluun palvelujen tuottajana. Hankkeella Kylätalo Eurolaa ja sen ympäristöä kehitetään niin, että siellä on kyläyhteisön jäsenillä mahdollisuus harjoittaa omaa liiketoimintaa tai työllistyä erilaisissa palvelualan tehtävissä.

2. Paikallisyhteisöt ja lähidemokratia, sosiaalinen pääoma, lisätään asukkaiden viihtyisyyttä ja hyvinvointia monipuolisten reittien ja virkistysaluehankkeiden avulla. Tuetaan kulttuurin ja paikallisen tapahtumatuotannon kehittämistä.

- Paikalliset tavoitteet: Hankkeella tehdään patikkahiihtoreittien, moottorikelkkareitin ja lintuharrastuskohteiden suunnittelu ja maanomistajasopimukset. Kylätalo Eurolaa ja sen ympäristöä kehitetään erilaisten tapahtumien pitopaikkana.

Hankkeella lisätään Kuusaan-Jokelan kylän tunnettavuutta sekä ihmisten kiinnostuvuutta kylää kohtaa, mikä auttaa kylää kehittymään ja saamaan uusia vakinaisia asukkaita kylälle. Kokonaishankkeella kehitetään kyläläisten työllistymismahdollisuuksia mm. matkailu- ja vuokraustoiminnan lisääntymisen myötä ja parannetaan jo lähialueella olevien pienyrittäjien, mm. pitopalveluyrittäjien, käsityöläisten ja vähittäiskaupan toimeentulo mahdollisuuksia. Lisäksi kehitetään erilaista kurssitoimintaa, mm. käsityö-, ruoka- ja kalastuskursseja. Pitkällä aikavälillä pyritään kehittämään kylälle monipalvelukeskus, jossa voitaisiin tarjota esim. terveys-, kuntoutus-, kaupungin- ym. viranomaispalveluita.

4.2. Toteutus

Hankkeessa oli palkattuna osa-aikainen projektipäällikkö Teija Nurmenniemi ajalla 1.3.2017-31.10.2018.

Tehdyt toimenpiteet ja aikataulu

Juhlatilojen ja palvelujen tuotteistaminen

1.1.-30.4.2017

Juhlatilojen ja palvelujen tuotteistaminen on aloitettu. Suunnittelussa on ollut mukana Heikki Kumpula, Taina Ruhala, Maria Ruhala-Venetpalo, Sirkka Kumpula, Katja Koistila, Teija Nurmenniemi, suunnittelupalavereja on pidetty kaksi kertaa. Tuloksena on saatu alustava kylätalon vuokrahinnoittelu, suunnitelma ruokailujen järjestämisestä, saatu kartoitettua käytettävissä olevat astiastot, sekä astiastojen ja juhlatilojen vuokrausmahdollisuudet. Lisäksi on suunniteltu Euroolan sisätilojen sisustusta, ja pyydetty tarjoukset tekstiileistä mm. verhoista ja tarjoilupöytien liinakankaista. Suunnittelua ja tuotteistamista jatketaan mm. kartoittamalla paikallisten pitopalveluyrittäjien ja järjestöjen kanssa yhteistyömahdollisuuksia mm. juhla- ja leiritoiminnan ja muiden tapahtumien kehittämiseksi Eurolaan.

1.5.-31.8.2017

Eurolan juhlatilojen suunnittelu ja sisustuksen muutokset ovat saatu Euroolan sisätilojen osalta melkein päätökseen, vielä tarvitaan jonkin verran eri toimintojen järjestämistä ja toimintojen parantamista sujuvammaksi tilaisuuksien järjestämisessä.

Pitopalvelun järjestämisestä Eurolassa on neuvoteltu kahden yhteistyökumppanin kanssa. Kokki Soile Kivirannan ja pitopalveluyrityksen perustava Teemu Talalan kanssa. Molemmat ovat olleet kiinnostuneita asiasta, ja Soile Kiviranta on

ollut mukana suunnittelussa, kun on mietitty ruokalistoja erilaisiin Eurolassa pidettäviin tilaisuuksiin ja avustanut hinnoittelussa.

Eurolassa on järjestetty yksi hääjuhla sisätilojen muutostöiden jälkeen. Soile Kiviranta oli mukana suunnittelemassa ja hinnoittelemassa menukokonaisuutta sekä tilaisuudessa kokkina. Häätilaisuudesta saatiin hyviä kokemuksia jatkokehittämistä ajatellen mm. menukokonaisuus toimi hyvin, asiakkaat olivat ruokaan erittäin tyytyväisiä ja asiakkaalta saatiin positiivista palautetta.

Omassa sisäisessä tarkastetussa tuli monia vielä kehittämistä vaativia asioita esille mm. keittiötila on pieni, joten sen toimintaa pitää kehittää toiminnoiltaan erilaiseksi. Nyt olleessa häätilaisuudessa oli 4 henkilöä töissä, lähes 100 hengen tilaisuudessa, ja henkilöt eivät ole kokkia lukuun ottamatta alan ammattilaisia ja eivät olleet aiemmin toimineet yhdessä, joten toimintojen sujuvuuteen pitää kiinnittää vielä huomiota, etenkin kun aina ei ole samat henkilöt töissä vai talkootöinä tehtävissä töissä henkilökunta voi vaihtua. Lisäksi työt olivat liian kuormittavia näin pienelle henkilökunnalle, joten henkilökuntaan pitää olla tilaisuuksissa töissä enempi ja tehtävät tulee paremmin organisoida ja porrastaa, että jää taukoja työskentelyn välillä.

Eurolassa ei ole omia astioita yli 60 hengen tapahtumiin tarpeeksi, joten se aiheuttaa lisätöitä ja lisäkuluja kun astiat vuokrataan muualta.

Seuraavana kehittämistavoitteena on, että suunnitellaan ruokalistat erilaisia juhlatilaisuuksia varten. Ruokalistat mietitään ja toteutetaan niin, että kaikki toimijat pystyvät toteuttamaan ne ja laatu on yhtenäinen, riippumatta tekijästä.

Etsitään yhteistyökumppania, jotka tekisivät leivonnaiset tilaisuuksiin mm. täytekakut, voileipäkakut, ym. leivonnaiset mitä asiakas haluaa tarjottavan.

Selvitetään lähialueen siivouspalvelut ja vaihtoehtona, että löytyykö kylältä henkilöitä, joita voidaan palkata tekemään siivouksia aina Eurolan tilojen käytön jälkeen.

1.9.-31.12.2017

Juhlapalveluiden kehittämistä on jatkettu, juhlasuunnittelusta vastaava työryhmä on kokoontunut 3 kertaa syksyn aikana. Työryhmään kuuluvat Taina Ruhala, Maria Ruhala-Venetpalo, Soile Kiviranta ja Teija Nurmenniemi. Syksyn aikana on tehty menuehdotukset pikkujouluja, muistotilaisuuksia ja merkkipäiviä varten sekä Eurolan juhlatilavuokrahinnoittelu ja Eurolan tilavarausedot. Menut on suunniteltu ja hinnoiteltu ja niistä on julkaistu tiedot www.kuusaa.com sivuilla sekä tehty esitekansio, joka on Eurolassa esillä. Kotisivuille ja esitekansioon lisätään mm. häämenuehdotukset hinnoittelun valmistuttua. Keväällä 2017 tehtyä hääjuhlahinnoittelua tarkistetaan, ruokaehdotukset säilyvät tehdyn mukaisina. Juhlapalveluita on markkinoitu kyläyhdistyksen kotisivuilla ja facebookissa.

1.1.-30.11.2018

Juhlapalveluiden kehittämistä on jatkettu. Huhtikuussa 2018 suunniteltiin pidettäväksi juhlapalveluista testitilaisuus, johon suunniteltiin oma ruokalista, jossa olisi testattu osa aiemmin suunnitelluista ruuista ja pyrittiin kehittämään vielä ruokalista, jossa olisi otettu huomioon paikalliset raaka-aineet ja testattu niiden toimivuus ruokapitojen listana.

Testitilaisuuteen kutsuttiin 25 hlöä. Testitilaisuus jouduttiin perumaan osallistujien vähäisyyden takia, koska emme olisi saaneet tarpeeksi kattavaa otantaa, että kehittämisen näkökulmasta sillä olisi ollut merkitystä.

Kesäkuussa 10.6.2018 järjestettiin Eurolassa avoimet ovet tapahtuma, jossa esiteltiin juhlapalvelutiloja ja leiritoimintatiloja. Mukana yhteistyökumppanina oli Maaselän Latu ry. Tilaisuudessa tarjottiin soppatykistä hernekeittoa sekä laavulla oli makkaranpaistoa ja nokipannukahvit. Osallistujia tapahtumassa oli n. 200 henkeä.

Elokuussa 2018 jatkettiin vielä juhlapalveluiden suunnittelua, ja suunniteltiin virkistyspäiväpaketti ja pikkujoulupaketti.

Juhlaruokailuista järjestettiin uudelleen testitilaisuus 4.11.2018, jolla testattiin juhlapalvelujen toimivuutta ja koko toimintaketjua hankinnasta lopputuotteeseen saakka. Testin tarkoitus oli löytää ongelmakohtia, ja miettiä niihin parannuskeinot sekä testata ruokien soveltuvuutta juhlaruokailuihin. Testitilaisuuteen yhdistettiin kyläläisten joka syksyinen ruokailu ja hankkeiden päätöstilaisuus, että saadaan



mahdollisimman paljon väkeä paikalle ja suurempi otanta mielipiteistä. Kyläläisiltä saatiin 47 vastausta, ja heidän lisäksi oli 4 kutsuttua testaajaa. Palaute oli hyvä, etupäässä positiivinen, mutta siellä saatiin tiedot myös ongelmakohtista, jonka perusteella voidaan vielä parantaa juhlapalvelujen toimintaa.

Kehittämistoimien tulokset juhlapalvelutoiminnassa

Eurolan tilat on saatu viihtyisiksi, ja hyvin toimiviksi, missä voidaan järjestää erilaisia juhla- ja tapahtumatilaisuuksia helposti. Hankeen kehittämistoimina on tehty hää-, merkkipäivä-, ja muistojuhlaa varten valmiiksi hinnoitellut menulistat sekä juhlaava kakkupöytä, jota voi käyttää erilaisissa tilaisuuksissa ja pikkujoulu- ja virkistyspäiväpaketit. Menulistat on toimivat hyvin, asiakas voi valita menulistoista helposti haluamansa ruuat, joiden perusteella on tehty sitten asiakkaalle tarkennettu tarjous. Lisäksi on tehty ruokavaihtoehtoista listat, joista asiakas voi valita ruuan, ja palvelut hinnoitellaan ruokavalintojen ja haluttujen palveluiden mukaan. Yhteistyö ulkopuolisen toimijan kanssa on lähtenyt hyvin liikkeelle ja on saatu jo pienimuotoisesti työllistettyä ihmisiä ja Jokuset Kyläyhdistys on saanut tuloja toimintaansa.

Juhlapalvelutoiminta saatiin hyvin liikkeelle, mutta leiritoiminnan osalta ei onnistuttu saamaan ihmisiä innostumaan toiminnasta, kylätiedotteissa useampaan otteeseen yritettiin aktivoida ihmisiä mukaan toimintaan, mutta kylältä ei löytynyt asiasta innostuneita. Leiritoiminnan kehittämisessä tehtiin hankesuunnitelmapaiheessa virhearviointi, eikä tunnettu tarpeeksi kyläisiä, mitä asioita he haluavat ja tarvitsevat kylälle, tämän tyyppiselle toiminnalle ei kylällä nähty tarvetta. Leiritoiminnan kehittämisellä oli tarkoitus saada kylän lapsille ja nuorille lisää harrastusmahdollisuuksia ja myöskin saada ulkopuolisia lapsia ja nuoria osallistumaan kylällä järjestettävälle leireille, mikä olisi lisännyt ihmisten kanssakäymistä.

Ulkoilureittien suunnittelu

1.1.-30.4.2017

Suunnittelu on aloitettu, suunnitteluryhmä on kokoontunut yhden kerran, ryhmään kuuluu Jarmo Koistila, Veijo Korpi, Kaarlo Kärkkäinen, Jorma Aakko ja Hannu Koistila. Hiihto- ja retkeily- ja moottorikelkkareitin pistoreitti kylätalolle on saatu merkittyä kartalle. Seuraavaksi kartoitetaan maanomistajat reitiltä ja tehdään maanomistajien kanssa maankäyttösopimukset. Projektisuunnitelmassa oli kaksi lintumatkailukohde vaihtoehtoa, mutta Nuijunjärven kosteikkoalueen suunnittelusta luovuttiin, ja jatkossa selvitetään Hirsinevan alueen käyttömahdollisuuksia.

1.5.-31.8.2017

Ulkoilureittisuunnitelmasta tiedotettiin kylätiedotteella 2/2017. Yksi maanomistaja ilmoitti, ettei hänen maansa kautta reittiä saa tehdä Eurolaan. Joten jouduttiin miettimään uutta reittivaihtoehtoa.

Ulkoilureittien suunnitteluun saatiin asiantuntija apua Maaselän Ladulta ry:ltä. Maaselän Ladun edustajien Hannu Virtasen ja Jouko Hirvasahon kanssa kokoonnuttiin Eurolaan 10.7.2017. Retkeilyreitit linjasta muutettiin, koska alkuperäisessä reittisuunnitelmassa, reitti kulki osittain Haapajärvi-Kärsämäki tiellä, joka on vilkas liikenteinen, niin se osuus haluttiin muuttaa niin, ettei Haapajärvi-Kärsämäki tiellä kulkemista tule, vain reitti alkaa ja päättyy Eurolaan ja reitti kulkee polkuja ja pieniä kyläteitä pitkin. Hiihtoreitin linjasta ei muutettu, reitti tulee kulkemaan niin, että siihen tulee Haapajärvi-Kärsämäki tien ylityksiä ainakin kaksi kertaa.

Patikka- ja hiihtoreittien osalta on selvitetty maanomistajat ja tehty maanomistajasopimuksista luonnokset, jotka olivat Jokuset Kyläyhdistys ry:n johtokunnan kokouksessa hyväksyttävänä.

Jokuset Kyläyhdistys ry on kokouksessaan 23.8.2017 keskustellut ja päättänyt ulkoilureittien osalta, ettei kyläyhdistyksellä ole tässä vaiheessa taloudellisia ja henkilöstöresursseja tehdä ulkoilureittejä, joten suunnittelua ja toteutusta siirretään toistaiseksi.

1.9.-31.12.2017

Ohjausryhmän kokouksessa 6.9.2017 keskusteltiin ulkoilureittiasiaista ja selvitystyötä päätettiin jatkaa suunnitelmien mukaisesti. Kyläyhdistyksen ulkoilureittien tekemisen kielteiseen suhtautumiseen vaikuttavia asioita selvitettiin, miten muualla on tehty kylien reittejä ja käytiin tutustumassa Alpuassa Vihannin kinttupolut ulkoilureitin tekoprosessiin 24.9.2017, mukana olivat Heikki Kumpula, Taina Ruhala, Teija Nurmenniemi ja Eero Nurmenniemi. Ulkoilureittiprojektin puuhanaainen Seija Jussinniemi kertoi ulkoilureitin tekovaiheista ja asioista mitä esim. maanomistajalupa-asioissa ja reitin teossa tulee huomioida, miten turvallisuusseikat tulee ottaa huomioon. Tutustumiskäynnistä saatiin paljon tietoa ja apua oman reitin suunnitteluun ja kyläyhdistystä huolestuttavista asioista saatiin lisätietoa esim. vastuu kysymyksistä, rakentamistavoista, maanomistajasopimuksista. Haapajärvelle on lisäksi suunnitteilla laajempi kylien yhteinen ulkoilureittihanke, jolla olisi toteutuessaan merkittävästi vaikutus reittien investointeihin ja rakentamiseen.



Reittisuunnitelman mukaan on tehty maanomistajasopimukset karttaliitteineen ja ohjausryhmän kokouksessa 6.9.2017 sovittiin, että Heikki Kumpula käy esittelemässä reittisuunnitelman maanomistajille ja neuvottelee sopimuksista.

1.1.-30.11.2018

Reittisuunnitelmia on jouduttu muuttamaan kolme kertaa, koska maanomistajat eivät annan lupaa tehdä reittiä maa-alueensa kautta, viimeinen reittisuunnitelma ja uudet maanomistajasopimukset on tehty syyskuussa 2018. Lisäksi ohjausryhmän kokouksessa 24.9.2018 päätettiin selvittää vielä reitti Kruununkivelle, joka sijaitsee Karsikkamäellä. Kruununkivi on 1760-luvulta oleva kivi, jossa on kruunu, vuosiluku ja ortodoksinen risti, tarkempaa tietoa kiven tarkoituksesta ei ole, maanomistajaolosuhteet selvitettiin, mutta lupien saannissa oli vaikeuksia, ja tässä vaiheessa tästä kohteesta luovuttiin.

Eurolasta lähtevästä ulkoilureitin maanomistajaluvista Heikki Kumpula ja Taina Ruhala on neuvotellut maanomistajien kanssa, ja reitti on muutettu niin, että se kulkee Eurolasta Haapajärven kaupungin tieoikeutta pitkin Haapajärven kaupungin maalla ja siitä on tehty pistoreitti Kaarlo Kärkkäinen ja Maija-Liisa Kärkkäisen maa-alueelle.

Hirsinevan ja Nuijunjärven lintuharrastuskohteet

1.1.-31.8.2017

Lintuharrastuskohteiden kehittämisessä ei ole vielä tehty toimintoja. Taina Ruhala ja Heikki Kumpula on olleet yhteydessä Haapajärvellä toimivaan luontokuvaajaan, jolta haluttaisiin saada asiantuntija apua suunnitteluun.


1.9.-31.12.2017

Lintuharrastuskohteiden kehittämisessä on edetty vieraillemalla Hirsinevan natura-alueella 17.9.2017, mukana oli asiantuntijana luontokuvaaja Veijo Toivonniemi. Kyläyhdistyksestä oli tutustumiskäynnillä Heikki Kumpula, Markku Piipponniemi, Kaarlo Kärkkäinen ja Teija Nurmenniemi. Sovittiin, että Veijo Toivonniemi käy ilmakuvauksessa aluetta, kun sääolosuhteet sen sallivat, että saadaan paremmin käsitys suoalueesta mihin kannattaisi rakentaa lintutorni ja kuvauskojut. Samalla tutustumiskäynnillä käytiin Hankilannevalla. Asia ei etene ennen kevättä 2018.



1.1.-30.11.2018

Lintuharrastuskohteen kehittämistä on jatkettu kesällä 2018. Ohjausryhmän kokouksessa päätettiin keväällä 2018, että Hirsinevan alueesta otetaan ilmakuvat ja sitä kautta selvitetään lintutornin paikkaa. Ilmakuvien ja karttojen perusteella mietittiin ohjausryhmän kokouksessa 24.9.2018 kolmen paikan välillä, mikä soveltuisi parhaiden lintutornin paikaksi ja mihin saataisiin maanomistajilta läpikulkuoikeus natura-alueelle. Kaksi kohdetta oli Jokelan kylän puolella ja yksi Tervankankaalla. Ohjausryhmän kokouksessa päätettiin tehdä katselmuskäynti Hirsinevalle Tervankankaan puolelta. Katselmuskäyntiin osallistuivat 30.9.2018 Teija Nurmenniemi, Taina Ruhala ja Markku Piipponniemi, katselmus käynnin perusteella päätettiin, että lintutorni rakennetaan Tervankankaan puolelle. Katselmuksen jälkeen päätettiin lintutornin paikaksi Tervankankaan kohdalta rakentaa lintutorni n. 80-100 m suon reunasta suolle. Rakentamisesta lähetettiin Metsähallitukselle lupahakemus maa-alueen käytöstä. Alue on natura 2000-alue ja v. 2017 siitä on tullut myös luonnonsuojelualue. Metsähallitus ei antanut lupaa rakentaa lintutornia, koska alue on linnallisesti herkkä alue ja tahattoman/tahallisen alueen häirinnän vuoksi. Joten joudumme luopumaan lintutornin rakennussuunnitelmista. Alueella saa vieraila jokamiehenoikeudella sekä siellä saa metsästä.

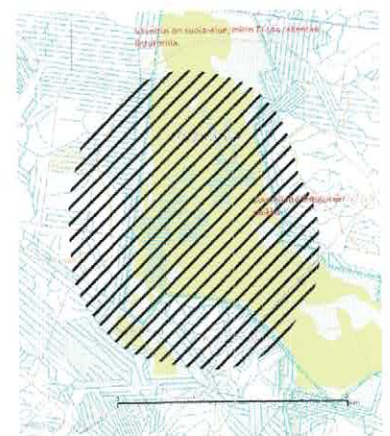

Moottorikelkkauran pistoura Eurolaan

Moottorikelkkareitti on ollut mukana suunnittelussa kun on tehty ulkoilureittisuunnittelua, ongelmana reitissä on ollut, että sitä on vaikea saada Kylätalo Eurolaan saakka maanomistajaolosuhteiden takia ja reitti tulisi kulkemaan talojen läheisyydessä ja viljellyillä pelloilla.

Kurssi- ja harrastustoiminnan kehittäminen

Kyläläisten kiinnostusta kehittämistyöhön tiedusteltiin useammassa kylätiedotteessa sekä ohjausryhmässä keskusteltiin asiasta. Tässä vaiheessa ei löytynyt kiinnostusta asiaan, mutta uskoisin, että kun investointihankkeella on rakennettu- ja hankittu kalustoa, joka mahdollistaa erilaisten kurssien ja harrastusleirien pitämisen ja ulkoilureittejä kehitetään alueella, niin kurssi- ja harrasteleirit lisääntyvät Eurolassa.

Opintomatka

Opintomatka tehtiin Pohjois-Karjalaan 22.-23.4.2017. Mukana oli 21 henkeä, mukana oli useista kylistä Haapajärveltä. Matkan teemana oli tutustua kylämatkailukohteisiin ja kylätalojen käyttöön matkailu- ja juhlapaikkana ja Kylätalon Monipalvelukeskus -hankkeeseen. Lisäksi tutustuttiin matkailu- ja käsityöalan pienyritysten toimintaan ja tapaan, miten kylä kehitetään eri puolella Suomea ja miten erilainen elinympäristö ja kulttuuri vaikuttaa kyläyhteisön toimintaan.

Kylätalo Monipalvelukeskuksena

1.1.-30.4.2017

Kylätalo Monipalvelukeskuksena oli keskeisenä teemana Pohjois-Karjalaan suuntautuvalla opintomatalla. Ilomantsissa on ollut vastaavan tyyppinen hanke vuosina 2013-2014, opintomatalla hankkeen vetäjä kertoi hankkeen eri vaiheista ja millaista toimintaa hankkeella on saatu aikaan Ilomantsin alueen eri kylissä.

1.5.-31.8.2017

Kylätalo Monipalvelukeskuksena palvelujen tarvetta selvitetään hankkeen aikana. Kuusaa-Jokelan kyläläisille lähtee kyselylomake toiminnan tarpeellisuudesta seuraavan hanketiedotteen mukana, joka jaetaan Kuusaa-Jokelan kylien talouksiin 10.9.2017 mennessä. Kyselyn tuloksien jälkeen tehdään johtopäätökset, lähdetäänkö viemään asiaan eteenpäin.

1.9.-31.8.2018

Kylätalo Monipalvelukeskuksena palveluista tehtiin Kuusaa-Jokelan kyläläisille kyselytutkimus, missä kartoitettiin palvelujen tarvetta. Kyselylomake lähetettiin Kuusaa Sanomien ja hanketiedotteen mukana 90 talouteen ja lisäksi kysely oli vielä hankkeiden tiedotustilaisuudessa 30.10.2017. Vastauksia tuli 14 kpl, joissa 9 taloutta toivoi parempia palveluja ja 5 taloutta piti tämän hetkisiä palveluja riittävänä. Hankkeen osalta asia on selvitetty ja asian käsittely ja jatkotoimenpiteet tekee Jokuset Kyläyhdistys ry.

Kotisivupäivitykset

1.1.-30.4.2017

Hankkeen aikana tehdään uudet kotisivut Jokuset kyläyhdistykselle, sivujen muutos on ajankohtaista syksyllä 2017, siihen asti päivitetään nykyisiä sivuja. www.kuusaa.com sivuille on lisätty hankesivut, joihin on päivitetty hankehakemus ja päätökset, sivuille lisätään tietoja aina tarvittaessa, ja siellä tiedotetaan myös talkoista ja hankkeen tapahtumista.

1.5.-31.8.2017

Uudet kotisivuista on tehty luonnossuunnitelmia ja syyskuun aikana pyydetään tarjoukset.

1.9.-31.12.2017

Kotisivuista on pyydetty tarjoukset kolmelta eri toimijalta, mutta yhtään tarjousta ei ole saatu.

Jokuset kyläyhdistys ry on tilannut uudet kotisivut Pivosis Oy:ltä. Kyläyhdistys vastaavat suurimalta osin sivujen kustannuksista. Kehittyvä Kuusaa -kehittämishankerahalla tehdään osa päivityksistä sekä hankitaan valokuvia ja projektipäällikkö käyttää aikaansa tekstitysten tekemiseen sekä osa tekstityksistä tehdään kyläyhdistyksen ihmisten toimesta talkootyönä.

1.1.-30.11.2018

Markkinointi


Päivitetty kotisivut on otettu käyttöön 19.5.2018, ja sen jälkeen projektipäällikkö Teija Nurmenniemi on vielä päivittänyt uutta sisältöä.

Kuusaa-Jokelan kylä on liittynyt kylään.fi valtakunnalliseen markkinointiportaaliin, sivuille on tehty kylän esittely. Lisäksi on laitettu ilmoitus valtakunnalliseen kylään.fi karttaan ja kyläesitteeseen.

Heinäkuussa 2018 on julkaistu Kuusaa-Jokelan kylän kyläesite.

Toiminnasta ja tapahtumista on tiedotettu facebook sivuilla, sekä on menty mukaan visithaapajarvi.fi sivuille.

Hankkeelle on ostettu valokuvia ja ilmakuvia, joita on käytetty markkinointimateriaaleissa. Kuvia on ostettu Veijo Toivoniemeltä ja kuvauspalveluna Pirkko Vuontoniemeltä.



4.3. Tiedottaminen

1.1.-30.4.2017

Ensimmäinen kylän alueelle jaettava hanketiedote on julkaisu maaliskuulla 2017, hanketiedote oli Kuusaa-Jokelan Sanomien liitteenä. Tiedote on nähtävissä www.kuusaa.com sivuilla. Lisäksi tiedotuskanavana on facebook Kuusaa-Jokelan sivut, siellä tiedotetaan aina ajankohtaisista tapahtumista. Selänne -lehti on julkaissut jutun 8.4.2017 ilmestyvässä lehdessään.

1.5.-31.8.2017

Toinen kylän alueella jaettava hanketiedote on julkaistu kesäkuussa 2017, hanketiedote oli Kuusaa-Jokelan Sanomien liitteenä. Tiedote on nähtävissä www.kuusaa.com ja facebook sivuilla. Maanselkä-lehdessä oli juttu hankkeesta 6.7.2017 ja Popikki.fi sivuille on tehty juttu 29.8.2017 ja julkaistu 4.10.2017.

1.9.-31.12.2017

Kolmas kylän alueella jaettava hanketiedote on julkaistu syyskuussa 2017, hanketiedote oli Kuusaa-Jokelan Sanomien liitteenä. Tiedote on nähtävissä www.kuusaa.com ja facebook sivuilla. Kotisivuja www.kuusaa.com ja facebook-sivuja on päivitetty. Tiedotustilaisuus hankkeista järjestettiin Eurolassa 29.10.2017, mukana oli n. 30 kyläläistä.

1.1.-30.11.2018

Neljäs kylän alueella jaettu hanketiedote on julkaistu helmikuussa 2018, Viides kylän alueella jaettu hanketiedote on julkaistu toukokuussa 2018, ja kesäkuun alussa ilmoitettiin Avoimet ovet Eurolassa hanke tapahtumasta Selänne lehdessä ja Maaselkä lehti teki tapahtumasta jutun. Kuudes kylän alueella jaettu hanketiedote on julkaistu lokakuussa 2018. Hanketiedote on Kuusaa-Jokelan Sanomien liitteenä. Lisäksi on tiedotettu hanketapahtumista, talkoista ja hankkeella kehitetyistä palveluista facebookissa. Juhlapalvelun testitilaisuudesta on lähetetty lehdistökutsut Selänne -lehdelle ja Maaselkä -lehdelle, molemmissa lehdissä julkaistiin juttu.

4.4. Resurssit

Toteutuksen organisointi

Hankkeelle on valittu projektipäälliköksi Teija Nurmenniemi, hänen työsuhteensa on 1.3.2017-31.10.2018.

Hankkeella on ohjausryhmä, jäsenet:

Jarmo Koistila

Pertti Lampela

Markku Piipponiemi

Keskipiste Leaderin edustajana Anni-Mari Isoherranen

Taina Ruhala

Heikki Kumpula

Teija Nurmenniemi, projektipäällikkö

4.5. Kustannusarvio ja rahoitus

Kustannusarvio	
Palkkakulut	40204,03 €
Ostopalvelut	6724,00 €
Flatrate	9648,97 €
Muut kustannukset	2347,00 €
Talkootyö	5280,00 €
Yhteensä	64204,00 €

Rahoitussuunnitelma		Rahoitussuunnitelma		
Haettava avustus	57783,60 €	Leader-tuki yht.	57783,60 €	90 %
Julkinen rahoitus yhteensä	57783,60 €	EU	24269,11 €	42 %
Yksityinen rahoitus	6420,40 €	Valtio	21957,77 €	38 %

-rahallinen osuus	1140,40 €	Kunta	11556,72 €	20 %
-talkootyö	5280,00 €	Julkinen rahoitus yht.	57783,60 €	90 %
Yhteensä	64204,00 €	Yksityinen rahoitus	6420,40 €	10 %
Kokonaisrahoitus	64204,00 €	rahallinen osuus	1140,40 €	
		talkootyö	5280,00 €	
		Yhteensä	64204,00 €	100 %
		Kokonaisrahoitus	64204,00 €	100 %

4.6. Raportointi ja seuranta

a) budjetin seuranta

Kustannusarvio	Hyväksytty kustannusarvio	Toteutunut 1.1.-31.12.2017	Toteutunut 1.1.-31.12.18
Palkkakulut	40204,03 €	20448,39 €	19859,94 €
Ostopalvelut	6724,01 €	1102,25 €	5621,76 €
Flatrate	9648,96 €	4907,61 €	4689,67 €
Muut kustannukset	2347,00 €	2347,00 €	
Talkootyöt	5 280,00 €	1725,00 €	4689,67 €
Yhteensä	64204,00 €	30530,25 €	34937,74 €

b) raportointi ja seuranta

Hankkeen aikana on pidetty ohjausryhmän kokouksia 3.5.2017, 6.9.2017, 29.1.2018, 16.5.2018, 25.9.2018. Lisäksi ohjausryhmä on hyväksynyt jatkoaikahakemuksen 1.9.-31.12.2018 ja muutosbudjetin 8.8.2018.

c) toteutusolelutukset ja riskit

Hankkeen toteutusolelutukset on toteutuneet, hankeaikataulussa olemme pysyneet melko hyvin. Budjetin osalta joitakin asioita arviointiin väärin, jonka takia on tehty kaksi kustannusarvio muutosta. Ostopalveluista on siirretty palkkoihin rahaa, koska hankehallintoon ja kehittämiseen on mennyt aikaa oletettua enemmän ja vastaavasti ostopalveluja on saatu käytettyä edullisemmin kuin mitä ajateltiin, osittain mm. retkeilyreittien maanomistajatietoja ei tarvinnut ostaa, vain ne saatiin Haapajärven kaupungin kautta, esiteet tuli halvemmaksi, kylään.fi nettisivumarkkinointi oli ennakkotiedoista poiketen ilmaista, valokuvaukset saatiin tehtyä edullisemmin kun mitä ennakkoon arviointiin, samoin kyläesite ja kotisivupäivitykset oli ennakoitua edullisemmat.

Ennakkoon ajateltuja riskejä oli talkoolaisten saanti, siinä on ollut jonkin verran ongelmia, mutta kaikki toimet on kuitenkin saatu tehtyä mitä ajateltiin talkoilla tehtäväksi. Toinen riski hankkeen toteuttamisessa on ollut retkeily/hiihto/moottorikelkkareittien/lintukohteen maanomistajaluvat, nämä asiat on paljon työllistäneet, koska reittejä ja suunnitelmia on jouduttu muuttamaan. Osittain asioista on jouduttu luopumaan maanomistaja olosuhteiden takia, kun ei ole saatu lupia, yllättävin asia oli Metsähallituksen suhtautuminen lintutornin rakentamiseen. Retkeily/hiihtoreittien osalta olemme saaneet muutettua reittiä niin, että se voidaan toteuttaa.

4.7. Yhteistyökumppanit

Lähialueen kyläyhdistykset, lähialueen yritykset, Haapajärven kaupunki, Haapajärven Yrityspalvelut Oy, Maaselän Latu ry.

4.8. Tulokset ja vaikutukset

Hankkeen tulokset 1.1.2017-31.12.2018

Juhlatila- ja palvelusuunnittelu:

Kehittämisellä olemme saaneet Kylätalo Eurolasta piha-alueineen toimivan juhla-, tapahtuma-, harrastuspalveluja tuottavan kohteen. Juhlapalvelujen ja muun toiminnan lisääntymisen myötä kylälle saamme lisää työllistymis- ja harrastusmahdollisuuksia, sekä voimme kehittää entisestään Eurolan ja kylän palveluja sekä ylläpitää Kylätalo Eurolan toimintaa. Juhlapalvelutoiminta on vielä alkuvaiheessa, mutta silti olemme saaneet jo Kylätalo Eurolan joitakin juhla- ja tapahtumatilaisuuksia, jonka kautta olemme saaneet työllistettyä ihmisiä.

Ulkoilureittien suunnittelu

Retkeily/Hiihtoreitin osalta on saatu tehtyä reittilinjat ja hankittua maanomistajaluvat. Reittilinjat suunniteltiin jouduttiin tekemään kolme kertaa, että saatiin reittilinjat kulkemaan niin, että saatiin maanomistajaluvat.

Retkeilyreittien kehittämisen ja investointien suunnittelua jatketaan Retkeilevä Haapajärvi -esiselvityshankkeella, mikäli hanke saa rahoituksen.

Lintumatkailukohteiden suunnittelu

Lintukohteen sijoittamista selvitettiin Hirsinevan ja Nuijunjärven alueelle. Nuijunjärven alue jätettiin suunnittelusta pois jo alku vaiheessa, koska oli niin paljon vastustusta lintutornin sijoittamiseksi Nuijunjärvelle. Hirsinevalle suunniteltiin lintutornia, vaihtoehtoina oli Jokelan kylän puoleinen alue ja Tervakankaan puoleinen alue, lisäksi otettiin alueesta ilmakuvat ja käytiin useamman kerran katselmuskäynneillä. Päätettiin, että lintutori tehdään Tervakankaan puolelle n. 100 m suon reunasta suoalueelle, koska paikka oli hyvä lintujen bongaamista varten. Sijoituspaikka selvityksen jälkeen haettiin Metsähallitukselta maanomistajana lupaa rakentaa lintutori alueelle. Metsähallitus ei myöntänyt lupaa lintutornin rakentamiselle, vain perusteli sitä sillä, että se on linnullisesti herkkä aluetta ja tahattoman/tahallisen alueen häirinnän vuoksi. Joten joudumme luopumaan lintutornin rakennussuunnitelmista. Alueella saa vierailta jokamiehenoikeudella sekä siellä saa metsästä.

Kylätalo Monipalvelukeskuksena

Hankkeella tehtiin kyläläisille kyselytutkimus asiasta. Kyläläiset eivät kovinkaan aktiivisesti vastanneet kyselyyn, mutta sieltä nousi joitakin harrastuksiin liittyviä toiveita, joita kyläläiset ovat jo toteuttaneet. Hankkeen osalta selvitystyö on tehty, ja jatkotoimenpiteet päättää Jokuset Kyläyhdistys ry.

Markkinointi

Kuusaa-Jokelan kylä on liittynyt kylään.fi markkinointiportaaliin. Kylään.fi sivuilla on julkaistu Kuusaa-Jokelan kylän esittely ja kylä on mukana kylään.fi kartassa ilmoituksella.

Juhlapalveluista on tehty esittelykansio ja esite.

Kyläyhdistyksen kotisivut www.kuusaa.com kotisivut on päivitetty ja tehty kyläesite Kuusaa-Jokelan kylästä, lisäksi kuvattu kylään ja kylätaloa ja on saatu hyvä kuvapankki, kuvia käytetään tiedottamisessa ja markkinoinnissa.

Markkinoinnin avulla voidaan jo huomata, että kiinnostus palvelujamme kohtaan on lisääntynyt.

5. Jatkotoimenpiteet

- Jokuset Kyläyhdistys ry on mukana Retkeilevä Haapajärvi -esiselvityshankkeessa. Hankkeella selvitetään Haapajärven ulkoilu- ja luontokohteita, ja tehdään suunnitelmat kehittämis- ja investointihanketta varten.
- Juhlapalvelu- ja tapahtumatoiminnan kehittämistä jatketaan. Kokkina toimiva Soile Kiviranta tekee opinnäytetyönään hinnoittelutyökalun ruokien hinnoittelua varten. Lisäksi juhlapalvelujen lisääntymisen myötä Kylätalo Euroolaan joudutaan uusimaan keittiökoneet, kuten uuni, astianpesukone, lattia kone, astioita.
- Monipalvelukeskus toiminta pidetään kehittämisessä koko ajan mukana.
- Muuta toimintaa kehitetään olemalla aktiivisesti mukana Haapajärven kaupungin ja järjestöjen yhteistoiminnassa.

Tulppo 10.1.2019

Jokuset Kyläyhdistys ry

 Jarmo Koistila
 puheenjohtaja


 Taina Ruhala
 sihteeri
